

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
URBANO																	
SD ALCANTARILLADO			24,627,458	13,879,685	10,747,773	24,627,458	13,879,685	10,747,773				23,782,719	13,319,637	10,463,083	844,738	560,048	284,690
SUMAS URBANO			24,627,458	13,879,685	10,747,773	24,627,458	13,879,685	10,747,773				23,782,719	13,319,637	10,463,083	844,738	560,048	284,690
RURAL																	
SD ALCANTARILLADO			9,804,777	6,182,786	3,621,991	9,804,777	6,182,786	3,621,991				9,726,200	6,135,641	3,590,559	78,577	47,145	31,432
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL			1,910,121	1,016,142	893,979	1,910,121	1,016,142	893,979				1,721,941	917,511	804,430	188,180	98,631	89,549
SUMAS RURAL			11,714,898	7,198,928	4,515,970	11,714,898	7,198,928	4,515,970				11,448,141	7,053,152	4,394,989	266,757	145,776	120,981
FAFEF																	
SC AGUA POTABLE			2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1		1	1,704,511		1,704,511	1,007,046		1,007,046
SD ALCANTARILLADO			23,987,296		23,987,296	23,986,827		23,986,827	469		469	23,599,465		23,599,465	387,361		387,361
SUMAS FAFEF			26,698,854		26,698,854	26,698,384		26,698,384	470		470	25,303,977		25,303,977	1,394,407		1,394,407
SUMA DE LA HOJA			63,041,210	21,078,613	41,962,597	63,040,740	21,078,613	41,962,127	470		470	60,534,837	20,372,789	40,162,049	2,505,902	705,824	1,800,078
SUBTOTAL			63,041,210	21,078,613	41,962,597	63,040,740	21,078,613	41,962,127	470		470	60,534,837	20,372,789	40,162,049	2,505,902	705,824	1,800,078
TOTAL			63,041,210	21,078,613	41,962,597	63,040,740	21,078,613	41,962,127	470		470	60,534,837	20,372,789	40,162,049	2,505,902	705,824	1,800,078

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO DE 2021

AL

31 DE MARZO

DEL

2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1 DE ABRIL DE 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
URBANO SD ALCANTARILLADO		24,627,458	13,879,685	10,747,773	24,627,458	13,879,685	10,747,773				23,782,719	13,319,637	10,463,083	844,738	560,048	284,690
SUMA DE LA HOJA		24,627,458	13,879,685	10,747,773	24,627,458	13,879,685	10,747,773				23,782,719	13,319,637	10,463,083	844,738	560,048	284,690
SUBTOTAL		24,627,458	13,879,685	10,747,773	24,627,458	13,879,685	10,747,773				23,782,719	13,319,637	10,463,083	844,738	560,048	284,690
TOTAL		24,627,458	13,879,685	10,747,773	24,627,458	13,879,685	10,747,773				23,782,719	13,319,637	10,463,083	844,738	560,048	284,690

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BANDO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VOUCHER DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 00 ALCANTARILLADO

PAGINA DE HOJA 1 DE 1

		CONVENIO CEA-UNA (PROGUAL URBANO 2021)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO DE 2021

AL

31 DE MARZO

DEL

2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2022

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO O EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
RURAL SD ALCANTARILLADO U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL		9,804,777	6,182,786	3,621,991	9,804,777	6,182,786	3,621,991				9,726,200	6,135,641	3,590,559	78,577	47,145	31,432
		1,910,121	1,016,142	893,979	1,910,121	1,016,142	893,979				1,721,941	917,511	804,430	188,180	98,631	89,549
SUMA DE LA HOJA		11,714,898	7,198,928	4,515,970	11,714,898	7,198,928	4,515,970				11,448,141	7,053,152	4,394,989	266,757	145,776	120,981
SUBTOTAL		11,714,898	7,198,928	4,515,970	11,714,898	7,198,928	4,515,970				11,448,141	7,053,152	4,394,989	266,757	145,776	120,981
TOTAL		11,714,898	7,198,928	4,515,970	11,714,898	7,198,928	4,515,970				11,448,141	7,053,152	4,394,989	266,757	145,776	120,981


 ING. ALVARO ROBERTO LUNA
 DIRECTOR GENERAL DE
 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SED ALCANTARILLADO

HUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-ONA PROYECTO RURAL 2021																														
No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN COMIENZO DE EJERCICIO	INVERSION APROBADA			INVERSION MONSTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS MONSTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (MONSTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROJ.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (DIAS)	TERMINO (DIAS)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL R33	PR.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL		FEDERAL	FEDERAL R33	PR.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.B.		
20210101-51-0081	AP-IP-ABR-011/2021 I 7/04/2021 AP-IP-JUL-005/2021 R 2/07/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. (RURAL)	SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUITAPILCO	C	16/06/2021	28/10/2021	3,025,703.	2,969,211.	2,099,447.	899,764.	2,999,211.	2,099,447.	899,764.	100				2,999,209.	2,099,447.	899,763.	100	2	1	1	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 276 2,733	1 276 2,733	100	SE REINTEGRO RECURSO A LA TESORO POR LA CANTIDAD DE \$ 1 FEDERAL Y \$ 1 FEDERAL R 33 TOTAL DE REINTEGRO \$ 2 DE FECHA 14/01/2022	
20210101-52-0082	AP-IP-ABR-012/2021 I 7/04/2021 AP-IP-JUL-006/2021 R 2/07/2021	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. (RURAL)	COMPOSTELA VILLA MORELOS	C	15/06/2021	14/08/2021	3,831,493.	3,788,053.	2,272,832.	1,515,221.	3,788,053.	2,272,832.	1,515,221.	100				3,788,053.	2,272,832.	1,515,221.	100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 397 2,733	1 397 2,733	100		
20210101-53-0086	AP-IP-ABR-018/2021 I 9/04/2021 AP-IP-NOV-015/2021 R 5/11/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (RURAL)	TEPIC AHUACATE, EL	C	12/07/2021	14/09/2021	2,529,640.	2,522,564.	1,513,538.	1,009,026.	2,522,564.	1,513,538.	1,009,026.	100				2,444,098.	1,466,459.	977,639.	97	78,466	47,079	31,387	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 196 2,320	1 196 2,320	100	SE REINTEGRO RECURSO A LA TESORO POR LA CANTIDAD DE \$ 47,079.99 FEDERAL Y \$ 31,386.62 FEDERAL R 33 TOTAL DE REINTEGRO \$ 78,466.61 DE FECHA 14/01/2022	
20210101-54-0097	AP-IP-ABR-032/2021 I 15/04/2021 AP-IP-NOV-018/2021 R 5/11/2021	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. (RURAL)	COMPOSTELA MIRAVALLAS	C	21/06/2021	30/11/2021	500,000.	494,949.	296,969.	197,980.	494,949.	296,969.	197,980.	100				494,840.	296,904.	197,936.	100	109	65	44	PROYECTO PERSONAS JORNALES	1 690 354	1 690 354	100	SE REINTEGRO RECURSO A LA TESORO POR LA CANTIDAD DE \$ 65 FEDERAL Y \$ 44 FEDERAL R 33 TOTAL DE REINTEGRO \$ 109 DE FECHA 14/01/2022	
SUMA DE LA HOJA								9,804,777.	6,182,796.	3,621,991.	9,804,777.	6,182,796.	3,621,991.					9,726,200.	6,135,641.	3,590,599.		78,577	47,145	31,432.						
SUBTOTAL								9,804,777.	6,182,796.	3,621,991.	9,804,777.	6,182,796.	3,621,991.					9,726,200.	6,135,641.	3,590,599.		78,577	47,145	31,432.						
TOTAL								9,804,777.	6,182,796.	3,621,991.	9,804,777.	6,182,796.	3,621,991.					9,726,200.	6,135,641.	3,590,599.		78,577	47,145	31,432.						

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO GEA-CNA (PROAGUA) RURAL 2021																															
NÚM. DE OBRA	NÚM. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN COMPROBANTES FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN INMETRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS INMETRADO POR SAF)			INVERSIÓN EJECUTADA			% AVANCE	SALDO (INMETRADO MENOS EJECUTADO)			METAS PROJ.		METAS ALC.	% AVANCE	OBSERVACIONES		
					RECIBO (DÍGITS)	TERMINO (DÍGITS)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL		FEDERAL R33	FIN	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33				U.M.	CANT.
2021010 207-0125	AP-IP-MAY-002/2021 I 4/05/2021	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA, EJERCICIO FISCAL 2021	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	04/05/2021	31/12/2021	52,968	52,968	26,483	26,483	52,968	26,483	26,483	100				50,214	25,107	25,107	95	2,752	1,376	1,376	INFORME PERSONAS	1	1,181,050	1	1,181,050	100	SE REINTEGRO RECURSO A LA TESORO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,379.80 FEDERAL R 33 TOTAL DE REINTEGRO \$ 2,751.60 DE FECHA 14/01/2022
2021010 237-0173	AP-IP-MAY-077/2021 I 28/05/2021 AP-IP-DIC-067/2021 A 28/05/2021	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-LOCALIDADES URBANAS Y RURALES 2021)	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	28/05/2021	31/12/2021	107,193	551,176	275,588	275,588	551,176	275,588	275,588	100				540,881	270,440	270,440	96	10,295	5,148	5,148	INFORME PERSONAS	1	1,181,050	1	1,181,050	100	SE REINTEGRO RECURSO A LA TESORO POR LA CANTIDAD DE \$ 5,147.84 FEDERAL Y \$ 5,147.80 FEDERAL R33 TOTAL DE REINTEGRO \$ 10,295.64 DE FECHA 14/01/2022
2021010 235-0172	AP-IP-MAY-076/2021 I 28/05/2021 AP-IP-NOV-053/2021 A 29/11/2021	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	28/05/2021	31/12/2021	643,175	1,226,371	674,504	551,867	1,226,371	674,504	551,867	100				1,130,646	621,963	508,862	92	95,525	52,541	42,985	INFORME PERSONAS	1	1,181,050	1	1,181,050	100	SE REINTEGRO RECURSO A LA TESORO POR LA CANTIDAD DE \$ 52,541 FEDERAL Y \$ 42,985.52 FEDERAL R33 TOTAL DE REINTEGRO \$ 95,526.52
2021010 408-0324	AP-IP-NOV-057/2021 I 29/11/2021	CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD			79,608	79,608	39,567	40,041	79,608	39,567	40,041	100								79,608	39,567	40,041	INFORME PERSONAS	1	1,181,050				SE REINTEGRO RECURSO A LA TESORO POR LA CANTIDAD DE \$ 39,568.48 FEDERAL Y \$ 40,041 FEDERAL R 33 TOTAL DE REINTEGRO \$ 79,609
SUMA DE LA HOJA								1,910,121	1,016,142	883,979	1,910,121	1,016,142	883,979					1,721,841	917,511	804,430		185,180	99,631	89,549							
SUBTOTAL								1,910,121	1,016,142	883,979	1,910,121	1,016,142	883,979					1,721,841	917,511	804,430		185,180	99,631	89,549							
TOTAL								1,910,121	1,016,142	883,979	1,910,121	1,016,142	883,979					1,721,841	917,511	804,430		185,180	99,631	89,549							

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO DE 2021

AL

31 DE MARZO

DEL

2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2022

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORI ZADO EN CONVEN IMPORTE	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)		
		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33
FAFEF																
SC AGUA POTABLE		2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1		1	1,704,511		1,704,511	1,007,046		1,007,046
SD ALCANTARILLADO		23,987,296		23,987,296	23,986,827		23,986,827	469		469	23,599,465		23,599,465	387,361		387,361
SUMA DE LA HOJA		26,698,854		26,698,854	26,698,384		26,698,384	470		470	25,303,977		25,303,977	1,394,407		1,394,407
SUBTOTAL		26,698,854		26,698,854	26,698,384		26,698,384	470		470	25,303,977		25,303,977	1,394,407		1,394,407
TOTAL		26,698,854		26,698,854	26,698,384		26,698,384	470		470	25,303,977		25,303,977	1,394,407		1,394,407


ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFPE
DEPENDENCIA EJECUTIVA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 1 DE 1

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MOD.	FECHA		AUTORIZADO EN COMISION FEDERAL	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AVANCE	SALDO (APROBADO MENOS INMETRIDADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AVANCE	SALDO (INMETRIDADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCAZAROS DE PROYECTO	FIN.		
2021010 200-0179	AP-IP-ENE-029/2021 I 29/01/2021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT (FINQUITO).	TEPEC	C	09/11/2020	18/12/2020		99,222.		99,222.	99,221		99,221	100	1		1	99,221		99,221	100				SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 152 364	1 152 364	100		
2021010 077-0028	AP-IP-MAR-018/2021 I 10/03/2021 AP-IP-OCT-038/2021 R 09/10/2021 AP-IP-DIC-020/2021 R 10/12/2021	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO LLANTOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT.	TEPEC	C	15/12/2021	29/12/2021		980,854.		980,854.	980,854		980,854	100						980,854		980,854				POZO PERSONAS JORNALES	1 1,500 2,781	0.05	5%	SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$980,853.95. SE REALIZO ANALISIS Y REVISIÓN MEDIANTE VIDEOGRABACIÓN Y SE DETERMINO RIESGO DE COLAPSO DE POZO PROFUNDO 29 DE DICIEMBRE DE 2021. EN PROCESO DE RESEÑALANDO SE REINTEGRO A LA TESORO LA CANTIDAD DE \$ 26,392
2021010 194-0117	AP-IP-ABR-057/2021 I 28/04/2021 AP-IP-JUN-116/2021 A 28/06/2021	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COPAL ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO Y CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE COPAL Y CJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT	TEPEC	C	07/06/2021	03/11/2021		1,487,577.		1,487,577.	1,487,577		1,487,577	100			1,461,185.		1,461,185.	98	26,392		26,392		SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 504 1,259	1 504 1,259	100		
2021010 203-0226	AP-IP-JUN-104/2021 I 23/06/2021 AP-IP-OCT-036/2021 R 29/10/2021	ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT	IXTLAN DEL RIO	C	04/08/2021	11/08/2021		144,105.		144,105.	144,105		144,105	100					144,105		144,105	100			POZO PERSONAS JORNALES	1 23,303 1,654	1 23,303 1,654	100		
SUMA DE LA HOJA								2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1			1	1,704,511		1,704,511		1,007,046		1,007,046						
SUBTOTAL								2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1			1	1,704,511		1,704,511		1,007,046		1,007,046						
TOTAL								2,711,558		2,711,558	2,711,557		2,711,557	1			1	1,704,511		1,704,511		1,007,046		1,007,046						

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FAFEE SO						FECHA		AUTORIZADO SI CONTINUA FEDERALES	INVERSION AFIRMEADA			INVERSION INVENTRADA POR SAF			% ASIMILACION	SALDO (AFIRMEADO MENOS INVENTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% ASIMILACION	SALDO (INVENTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.		% ALCANCE	OBSERVACIONES
Nº. DE OBRA	Nº. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. S.B.C.	INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	PR	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	PR	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.S.	CANT.	ALCANTARILLADO DE PROYECTO	PR			
2021010 199-0190	AP-IP-ENE-030/2021 I 29/01/2021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT. (FINQUITO).	TEPIC TEPIC	C	09/11/20	18/12/20		186,059.		186,059.	186,058			186,056	100	1		1	186,056.		186,056.	100			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 152 394	1 152 394	100			
2021010 078-0023	AP-IP-MAR-008/2021 I 4/03/2021 AP-IP-JUN-045/2021 A 10/06/2021	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ANTONIO ECHAVARRIA DOMÍNGUEZ (3ER. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	01/06/2021	30/07/2021		4,188,256.		4,188,256.	4,188,255			4,188,255	100	1		1	4,188,255.		4,188,255.	100			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 640 3,497	1 640 3,497	100			
2021010 100-0056	AP-IP-MAR-052/2021 I 23/03/2021 AP-IP-JUN-091/2021 R 21/06/2021	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA. ETAPA EN LA COLONIA 15 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT.	TEPIC TEPIC	C	15/06/2021	12/10/2021		2,544,271.		2,544,271.	2,544,271			2,544,271	100			2,544,271.		2,544,271.	100			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 352 2,188	1 352 2,188	100				
2021010 167-0092	AP-IP-ABR-026/2021 I 13/04/2021 AP-IP-JUN-050/2021 R 11/06/2021	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PROGRESO 2DA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT	XALISCO XALISCO	C	01/06/2021	24/06/2021		501,294		501,294	501,294			501,294	100			476,036.		476,036.	95	25,256		25,256	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 72 428	1 72 428	100	SE REINTEGRO A LA TESOROFE LA CANTIDAD DE \$ 25,256 APORTACIÓN FEDERAL R33 DE FECHA 14/01/2022		
2021010 195-0105	AP-IP-ABR-043/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUN-118/2021 A 28/06/2021	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COPAL ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE COPAL Y QJO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIIC, NAYARIT	TEPIC TEPIC	C	07/06/2021	03/11/2021		2,594,872.		2,594,872.	2,594,871			2,594,871	100	1		1	2,594,871.		2,594,871.	100			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 504 2,195	1 504 2,195	100			
2021010 187-0106	AP-IP-ABR-042/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUL-026/2021 A 7/07/2021	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT	BAHÍA DE BANDERAS SAN JUAN DE ABAJO	C	14/06/2021	11/09/2021		1,645,981.		1,645,981.	1,645,981			1,645,981	100			1,645,045.		1,645,045.	100	937		937	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 324 1,362	1 324 1,362	100			
2021010 191-0107	AP-IP-ABR-045/2021 I 23/04/2021 AP-IP-JUN-081/2021 R 17/06/2021	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA ZACUALPAN	C	01/07/2021	07/11/2021		2,499,014.		2,499,014.	2,499,014			2,499,014	100			2,447,464		2,447,464	98	51,550		51,550	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 420 2,105	1 420 2,105	100	SE REINTEGRO A LA TESOROFE LA CANTIDAD DE \$ 51,550 APORTACIÓN FEDERAL R33 DE FECHA 14/01/2022		
SUMA DE LA HOJA								14,139,747		14,139,747	14,139,745		14,139,745	2			2	14,062,002		14,062,002		77,743		77,743							
SUBTOTAL								14,139,747		14,139,747	14,139,745		14,139,745	2			2	14,062,002		14,062,002		77,743		77,743							
TOTAL								14,139,747		14,139,747	14,139,745		14,139,745	2			2	14,062,002		14,062,002		77,743		77,743							

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nº. DE OBRA		Nº. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN COMISIONES FEDERALES	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA POR SAF			% AJUSTE	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)			INVERSION EJERCIDA EJECUTOR			% AJUSTE	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)			METAS PROG.		METAS ALC.	% AJUSTE	OBSERVACIONES			
APROBACION Y FECHAS			PROYECTO	LOCALIDAD	E.E.C.	INICIO EJECUCION	TERMINO EJECUCION	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	FIN.	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	U.M.	CANT.	ALCANTARILLADO DE PROYECTO	FIN.				
2021010 165-0126	AP-IP-MAY-003/2021 I 4/05/2021 AP-IP-JUL-021/2021 R 6/07/2021 AP-IP-DIC-143/2021 R 30/12/2021		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC 3RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT	XALISCO XALISCO	C	01/07/2021	13/09/2021		2,899,864.		2,899,864.	2,899,863		2,899,863	100	1		1	2,899,863		2,899,863	100						SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 228 2,575	1 228 2,575	100		
2021010 232-0163	AP-IP-MAY-064/2021 I 26/05/2021 AP-IP-NOV-005/2021 R 3/11/2021		REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TERÁN Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OTLAN DEL RIO, NAYARIT.	OTLAN DEL RIO OTLAN DEL RIO	C	01/07/2021			2,287,748.		2,287,748.	2,287,748.		2,287,748.	100				1,978,130.		1,978,130.	86	309,618		309,618			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 220 1,834	0.92	92	SE REALIZARA REINTREGRO A LA TESORO POR \$216,733.00 APORTACION FEDERAL, RAMO 33, ANTICIPO POR AMORTIZAR \$ 92,885.00 TOTAL \$ 309,618.00 EN PROCESO DE RECIBION DE CONTRATO	
2021010 290-0207	AP-IP-JUN-056/2021 I 15/06/2021 AP-IP-NOV-004/2021 R 3/11/2021		EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LOS AYALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT-	COMPOSTELA AYALA, LOS	C	13/07/2021	10/10/2021		2,948,218.		2,948,218.	2,947,752.		2,947,752.	100	466		466	2,947,752		2,947,752	100						CARCAMO PERSONAS JORNALES	1 316 1,061	1 316 1,061	100		
2021010 281-0211	AP-IP-JUN-064/2021 I 16/06/2021 AP-IP-NOV-006/2021 R 3/11/2021		ADECUACIONES DE RED ELÉCTRICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	COMPOSTELA VILLA MORELOS	C	13/07/2021	10/10/2021		1,711,919.		1,711,919.	1,711,918.		1,711,918.	100	1		1	1,711,918.		1,711,918.	100						PLANTA PERSONAS JORNALES	1 397 1,065	1 397 1,065	100		
SUMA DE LA HOJA									9,847,549		9,847,549	9,847,082		9,847,082	467			467	9,537,464		9,537,464		309,618		309,618								
SUBTOTAL									23,987,296		23,987,296	23,986,827		23,986,827	469			469	23,599,465		23,599,465		387,361		387,361								
TOTAL									23,987,296		23,987,296	23,986,827		23,986,827	469			469	23,599,465		23,599,465		387,361		387,361								

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO**RESUMEN TRIMESTRAL**
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

INVERSIÓN ESTATAL

NO DEFINIDO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL
INVERSION ESTATAL U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL		1,543,455			1,543,455			991,094			991,094			552,361			552,361		
SUMA DE LA HOJA		1,543,455			1,543,455			991,094			991,094			552,361			552,361		
SUBTOTAL		1,543,455	-		1,543,455			991,094			991,094			552,361			552,361		
TOTAL		1,543,455			1,543,455			991,094			991,094			552,361			552,361		



INS. ÁLVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN ESTATAL

FONDO: NO DEFINIDO

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERA L DIRECT O	FEDER AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDER AL DIRECT O	FEDER AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. / OTROS	TOTAL	FEDER AL DIRECT O	FEDER AL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.			
202201000 6-0003	AP-IP-ENE- 013/2022 I 24/01/2022	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	TODO EL ESTADO TODO EL ESTADO	AD	24/01/22			1,543,455				1,543,455				991,094			991,094				552,361			552,361			INFORME PERSONAS JORNALES	1 29 3,840	0.64	64	64	
SUMA DE LA HOJA								1,543,455				1,543,455				991,094			991,094				552,361			552,361								
SUBTOTAL								1,543,455				1,543,455				991,094			991,094				552,361			552,361								
TOTAL								1,543,455				1,543,455				991,094			991,094				552,361			552,361								

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO**RESUMEN TRIMESTRAL**
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y A

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS
URBANO																			
SD ALCANTARILLADO		2,426,632		2,426,632				2,426,632		2,426,632									
SUMA DE LA HOJA		2,426,632		2,426,632				2,426,632		2,426,632									
SUBTOTAL		2,426,632		2,426,632				2,426,632		2,426,632									
TOTAL		2,426,632		2,426,632				2,426,632		2,426,632									

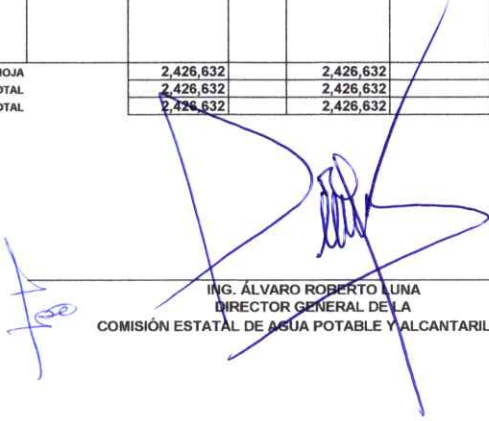

ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA:

SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						BALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL AL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL AL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL AL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL AL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL AL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PR.	PR.	
202201011 4-0072	AP-IP-MAR- 048/2022 I 18/03/2021 AP-IP-MAR- 085/2022 A 18/03/2021	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1 ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT (URBANO), (COMPLEMENTO)	TEPEC FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	C	18/03/2022	31/03/2022		2,426,632		2,426,632						2,426,632		2,426,632								SISTEMA	1	1	100	100	NOTA: ESTRUCTURA	
																											PERSONAS	1,300	1,300			APROBADO FEDERAL 2021 \$ 5,520,390.00
																											JORNALES	599	599			APROBADO 2021 FADEF \$ 2,070,560.00 REINTEGRO FEDERAL - \$370,258 APROBACION 2022 FADEF \$ 1,009,711.00 AMPLIACION 2022 FADEF \$ 816,921.00 (448,655, EN CONCEPTOS MAS 370,258, DEL REINTEGRO) MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 9,947,316.00
SUMA DE LA HOJA								2,426,632		2,426,632					2,426,632		2,426,632															
SUBTOTAL								2,426,632		2,426,632					2,426,632		2,426,632															
TOTAL								2,426,632		2,426,632					2,426,632		2,426,632															

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
